



系統バルブを閉止し、断水を実施。



散水栓にコンプレッサー接続



配管内に圧縮空気を充填。



圧力低下を確認。




音聴棒にて音聴調査を実施。



漏水探知機にて路面音聴を実施。



音聴棒にて地中音聴を実施。

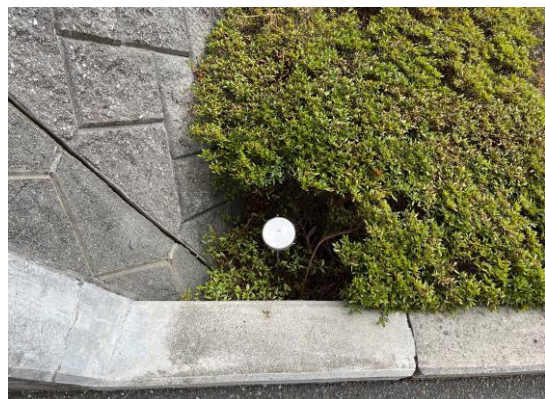

植栽埋設部で漏水音を確認し漏水箇所を確定。
